



3GEN[®] BUNGALOW

ÇELİK EV TEKNİK


ŞARTNAMESİ

3GEN-BUNGALOW
2025

PROTAS ÇELİK EV YAPIM ŞARTNAMESİ


Mimari Proje

ZEMİN KAT

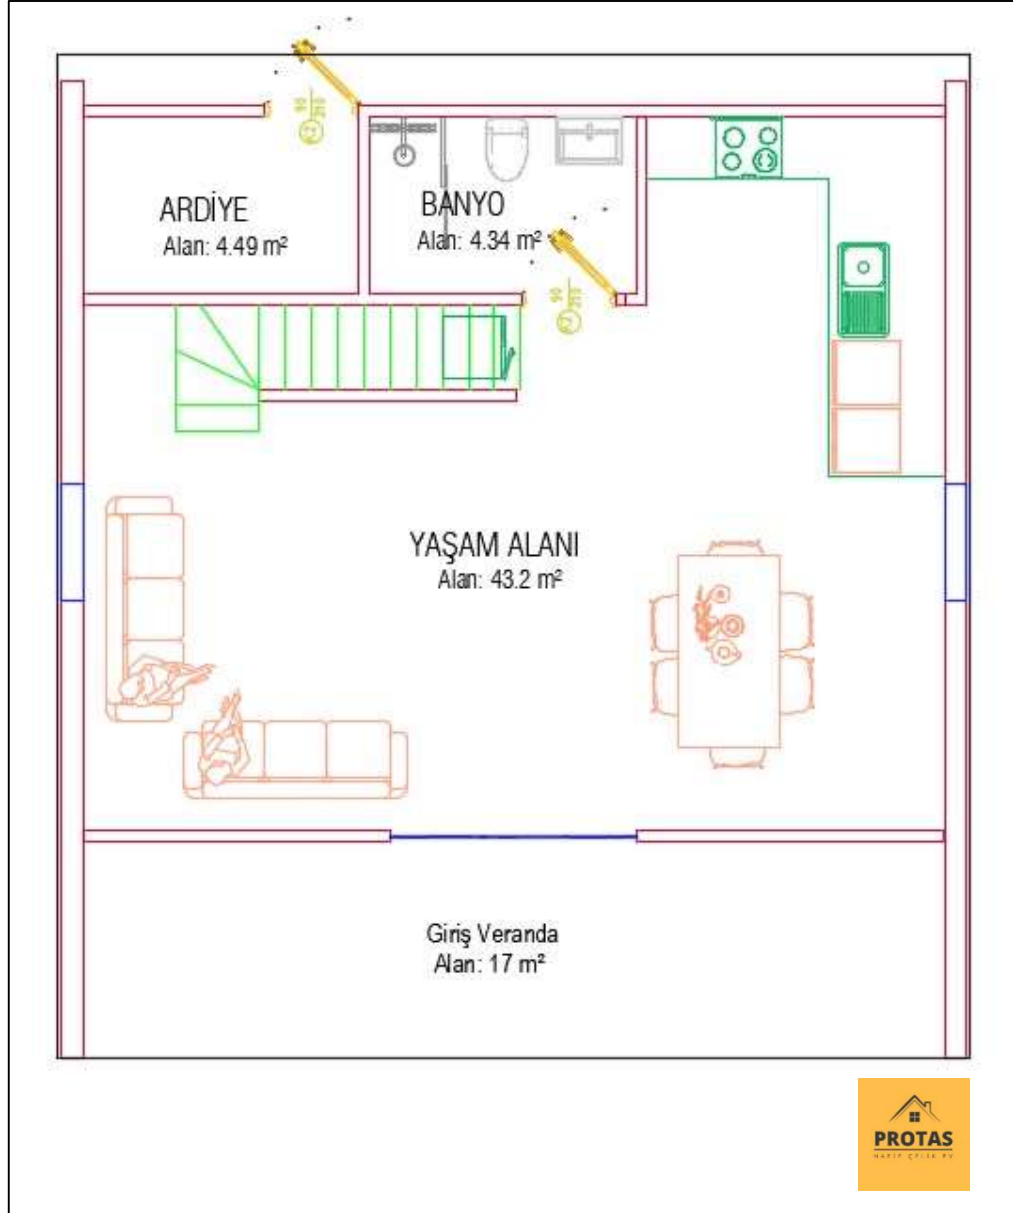


ZEMİN KAT: 81 m² Oturma Alanı

1.KAT PLANI

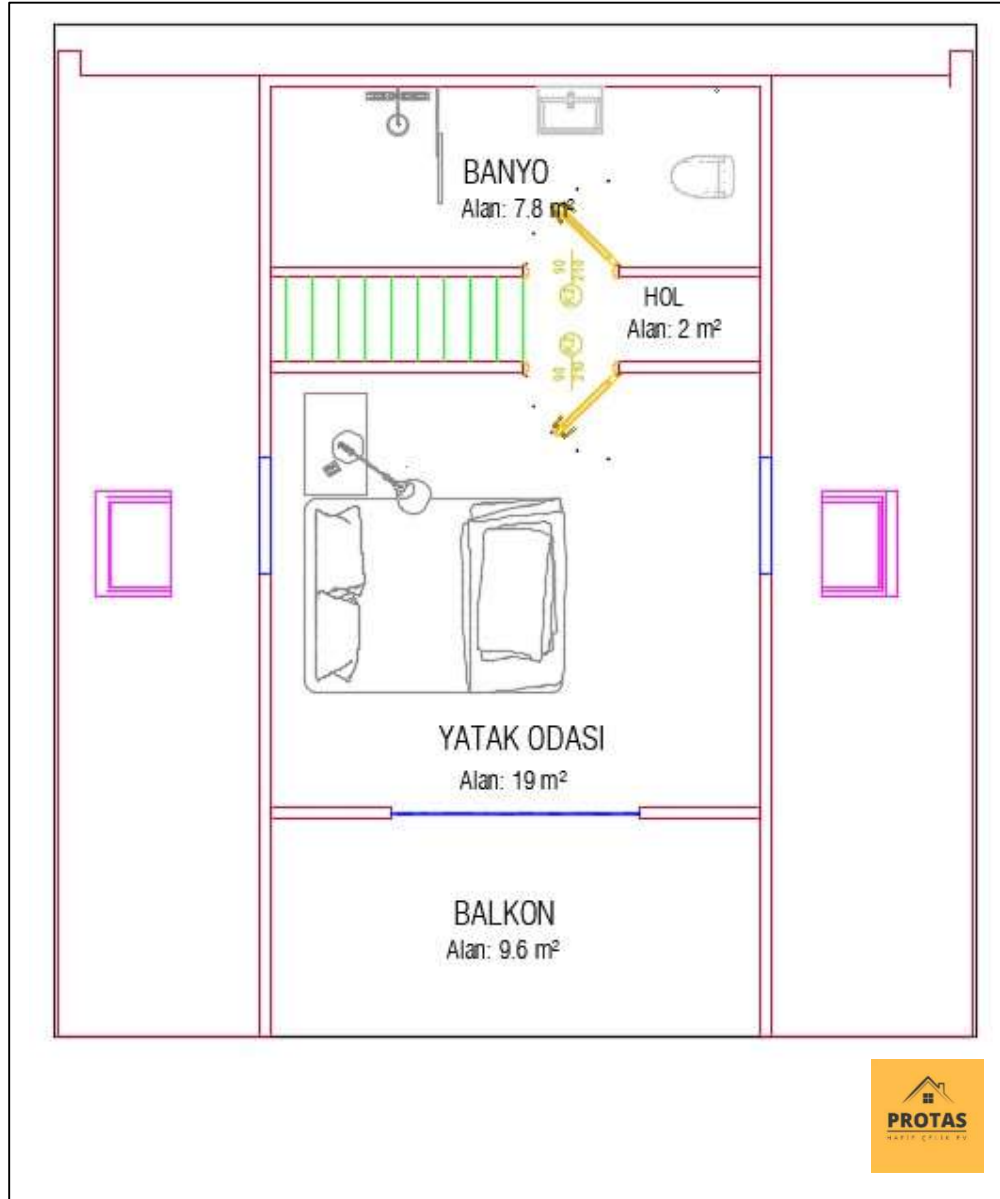

1.KAT : 44 m² Oturma Alanı

FOTOĞRAF

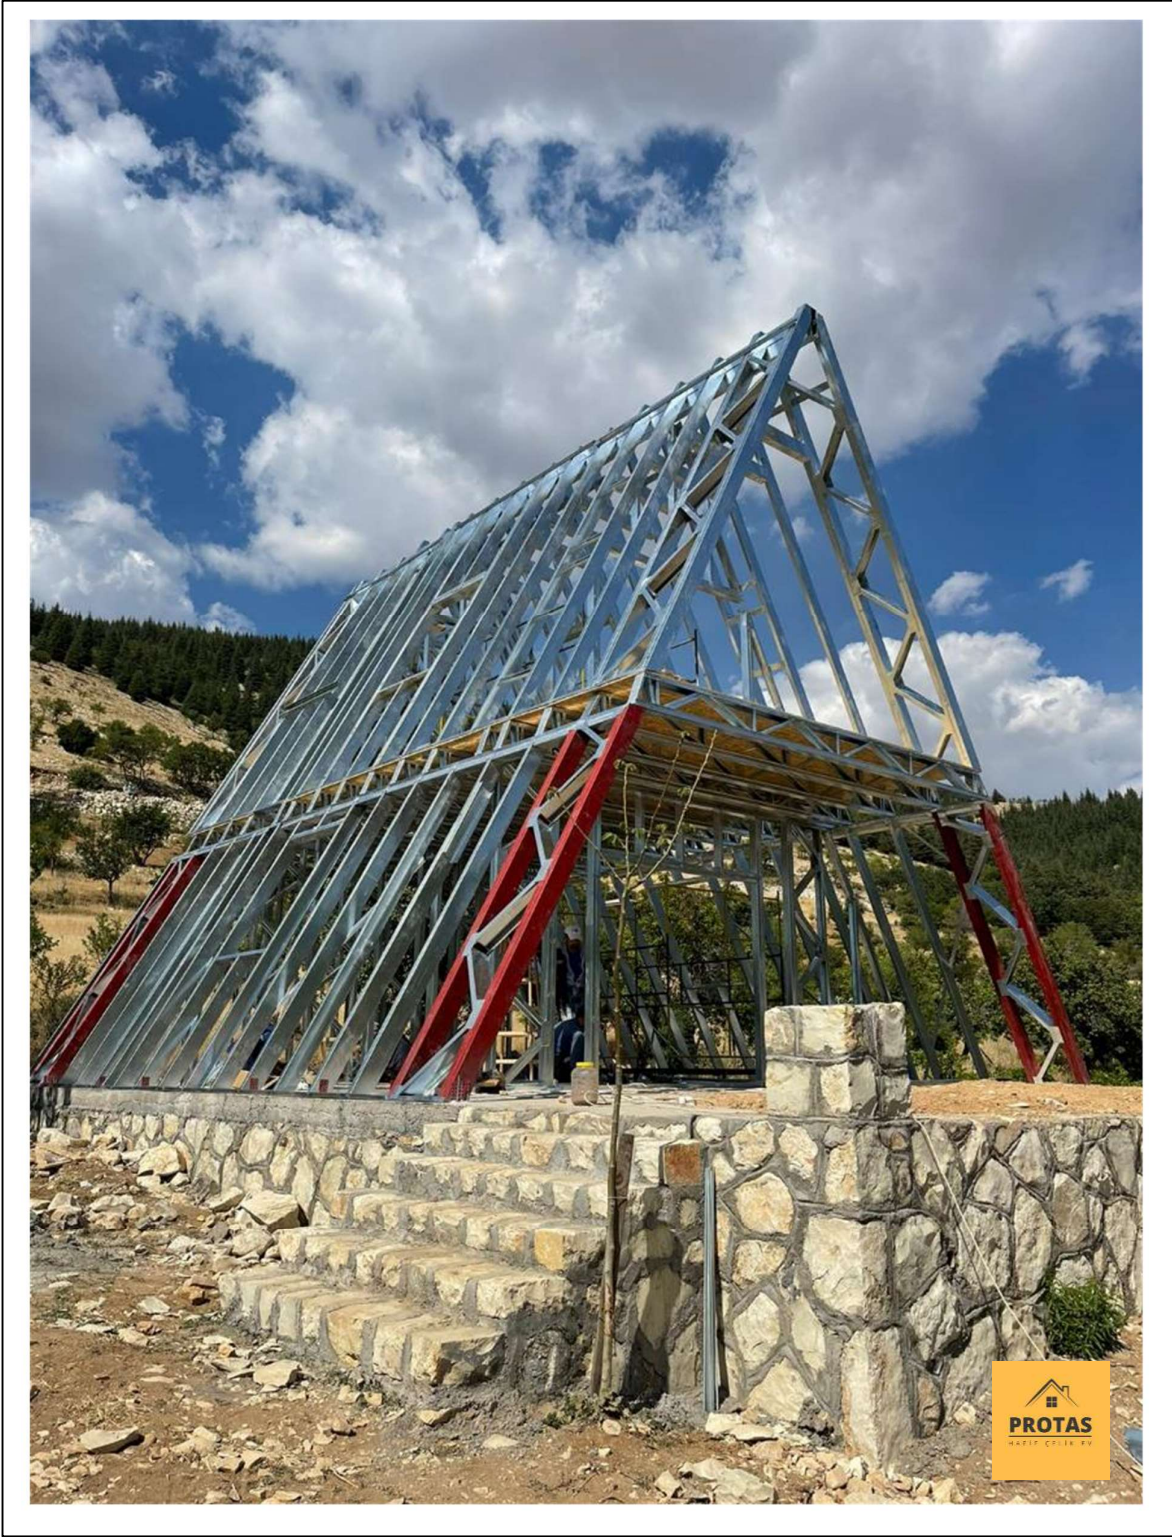



Yapılacak İmalat ve Teknik Özellikleri

PROTAS HAFİF ÇELİK EV				
TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ				
Yapısal Sistem	Yapım Tekniği	• PROTASVILLAS® ÇELİK YAPI - Soğuk şekillendirilmiş galvanizli çelik profiller ile tek katlı yapı		
	Bina Oturum Alanı	• Zemin Kat 81 m ² , 1.Kat 44 m ² , Toplam 125 m ² • Çatı 180 m ²		
	Kat Yüksekliği	• Zemin Kat 330 cm, 1.Kat 450 cm		
	Dış Duvar	• 12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı dış cephe levhası	A1 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
		• 10 mm Desenli fibercement levha	A1 sınıfı yanmaz	Hekimboard 10 mm Ahşap/Taş/Tuğla desenli
		• Alüminyum kaplı cephe örtüsü	3 katmanlı polyester alüminüze folyo kaplı reflektif örtü TS EN 13984	WATERSHIELD® ALU 130
		• 140/120/100/80 mm cam yünü şilte	0.040Wm/K	İzocam
		• 12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı iç cephe levhası	A2 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
		• Galvaniz I-U-C çelik profiller	S280+GDZ sınıfı standart çelikten statik projeye göre hesaplanan kesitler	
	İç Duvar	• 12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı iç cephe levhası	A2 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
		• 140/120/100/80mm cam yünü şilte	0.040Wm/K	İzocam
		• 12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı iç cephe levhası	A2 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
		• Galvaniz I-U-C çelik profiller	S280+GDZ sınıfı standart çelikten statik projeye göre hesaplanan kesitler	
		• Islak hacimlerde duvar kaplama levhası olarak suya dayanıklı alçı esaslı dış cephe levha kullanılır.		
	Bölme Duvar	• 12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı iç cephe levhası	A2 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
		• 80mm cam yünü şilte	0.040Wm/K	İzocam
		• 12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı iç cephe levhası	A2 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
		• Galvaniz alçıpan profiller		
		• Islak hacimlerde duvar kaplama levhası olarak suya dayanıklı alçı esaslı dış cephe levha kullanılır.		
	Tavan	• Galvaniz I-U-C çelik profillerden imal edilmiş karkas yapı	S280+GDZ sınıfı standart çelikten statik projeye göre hesaplanan kesitler	
		• 100/80mm cam yünü şilte	0.040Wm/K	İzocam
		• 12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı iç cephe levhası	A2 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
		• Islak hacim ve balkon/veranda da tavan kaplama levhası olarak suya dayanıklı alçı esaslı dış cephe levha kullanılır.		
	Arakat/Balkon/Teras	• Yalıtım şapı		
		• Nem bariyeri		
		• Ses yalıtım levhası	150 DNS-40mm kalınlık-0.040Wm/K	Ravaber
		• OSB 3 döşeme levhası	Sınıf 3-18mm kalınlık	Kronospan

		•Galvaniz I-U-C çelik profillerden imal edilmiş döşeme karkas yapı	S280+GDZ sınıfı standart çelikten statik projeye göre hesaplanan kesitler	
		•12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı iç cephe levhası	A2 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
		•İslak hacimlerde duvar kaplama levhası olarak suya dayanıklı alçı esaslı dış cephe levha kullanılır. •İslak hacimlerin zeminlerinde likit yalıtım malzemesi ile iki kat su yalıtımı yapılır.		
	Merdiven	•OSB 3 döşeme levhası	Sınıf 3-18mm kalınlık	Kronospan
		•Galvaniz I-U-C çelik profillerden imal edilmiş döşeme karkas yapı	S280+GDZ sınıfı standart çelikten statik projeye göre hesaplanan kesitler	
	Çatı Duvar	•Nem bariyeri	TS EN 13859-1 Nefes alan su yalıtım örtüsü	WATERSHIELD® 90
		•OSB 2 döşeme levhası	Sınıf 2-11mm kalınlık	Egger
		•15 mm fiberle güçlendirilmiş, alt yüzeyi takviyeli alçı esaslı çatı levhası	A1 Sınıfı Yanmaz	Boardex Roof-DALSAN
		•140/120/100/80mm cam yünü şilte	0.040Wm/K	Izocam
		•Galvaniz I-U-C çelik profillerden imal edilmiş karkas yapı	S280+GDZ sınıfı standart çelikten statik projeye göre hesaplanan kesitler	
		•12.5 mm fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı iç cephe levhası	A2 Sınıfı Yanmaz	Beyaz Corex-DALSAN
	Veranda	•12.0 mm desenli fibercement dış cephe levhası	A1 Sınıfı Yanmaz- Fugalı / Yalı baskı – Ahşap / Tuğla / Taş desenli	HekimBoard
		•Galvaniz I-U-C çelik profiller	S280+GDZ sınıfı standart çelikten statik projeye göre hesaplanan kesitler	
Kar Yüğü	“TS 498: Yapıların Hesabında Kullanılacak Yükler” standardında belirtilen III. ve IV. Kar bölgelerine göre, “ASCE 7-10: Minimum Design Loads for Structures and other Buildings” standardına göre hesaplanır.		I.Kar yağış bölgesi	
Rüzgâr Yüğü	“TS 498: Yapıların Hesabında Kullanılacak Yükler” standardında belirtilen III. ve IV. Kar bölgelerine göre, “ASCE 7-10: Minimum Design Loads for Structures and other Buildings” standardına göre hesaplanmıştır.			
Kullanılan Standartlar	ASCE 7-10: Minimum Design Loads for Structures and other Buildings			
	ANSI-AISC 360-16:“Specification for Structural Steel Buildings”			
	AISI 100-2016: Design of Cold Formed Steel Structures			
	TBDY 2019: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği			
	TS 500-2000: Betonarme yapıların Hesap ve Yapım Kuralları			
	TS 498: Yapıların Hesabında Kullanılacak Yükler			

- Tabloda **silik** renkli olarak yazılan imalatlar proje kapsamında yapılmayacaktır

PROTAS HAFİF ÇELİK EV

MİMARİ ÖZELLİKLER

Dış Cephe Duvar	Standart	•Akrilik Esaslı Dış Cephe Boyası	2 Kat, Silikon Esaslı	Jotun
		• Akrilik Esaslı Dış Cephe Astar Boyası	1 Kat, Silikon Esaslı	Jotun
		• Sıva filesi	160 gr/m² alkali dayanımlı	MARİNAS
		• Hazır mineral sıva	Hazır mineral sıva	DALSAN
		• Astar sıva	Probase Render- Birleşim yerlerine derz bantları kullanılarak uygulanır.	DALSAN
		• Isı yalıtım levhası	60 DNS-40mm kalınlık- 0.040WmK*	Pavaber
		• Zemin kat dış cephe duvarı ile temel birleşim bölgesinde elastik pah bandı ve çimento esaslı elastik yalıtım harcı ile su, ses ve hasereye karşı izolasyon yapılır.		
İç Cephe Duvar	Standart	•Silinebilir İpek Mat İç Cephe Boyası	2 Kat, Silikon Esaslı	Jotun
		• İç Cephe Astar Boyası	1 Kat, Silikon Esaslı	Jotun
		• Saten alçı		AR-ALÇI
		• Sıva filesi	160 gr/m² alkali dayanımlı	MARİNAS
		• Alçı sıva		AR-ALÇI
		• Alçı levhaların derz boşlukları DERZTEK® elastik hazır alçı sıva ve derz bandı kullanılarak doldurulur.		
	Islak Mekân	• Fayans Kaplama	Min. 30cmx60cm boyutlarında	Ege Seramik
İç Cephe Tavan	Standart	• Silikon esaslı Beyaz Tavan Boyası	2 Kat, Silikon Esaslı	Jotun
		• Tavan Astar Boyası	1 Kat, Silikon Esaslı	Jotun
		• Saten alçı		AR-ALÇI
		• Sıva filesi	160 gr/m² alkali dayanımlı	MARİNAS
		• Alçı sıva		AR-ALÇI
		• Alçı levhaların derz boşlukları DERZTEK® elastik hazır alçı sıva ve derz bandı kullanılarak doldurulur.		
	Islak Mekân	• Silikon esaslı Beyaz Tavan Boyası	2 Kat, Silikon Esaslı	Jotun
		• Tavan Astar Boyası	1 Kat, Silikon Esaslı	Jotun
		• Sıva filesi	160 gr/m² alkali dayanımlı	MARİNAS
		• Hazır mineral sıva		DALSAN
		• Astar sıva	Probase Render- Birleşim yerlerine derz bantları kullanılarak uygulanır.	DALSAN
Duvar Kâğıdı		• İmalat yapılmayacaktır.		
Asma Tavan		•Alçı panel ve profiller ile asma tavan	Hol, Antre ve Açık Mutfak – Salon alanında tavan çevresinde bant olarak en fazla 120m² yapılacaktır.	
Cephe Kaplama	Desenli fibercement kaplama	• Prekast levha astarı		Jotun
		• Desenli fibercement kaplama	Dış cephede en fazla 150m² cephe alanı kaplanacak şekilde kısmi olarak uygulanacaktır.12.5 mm Ahşap/Taş/Tuğla desenli	Hekimboard

	Alüminyum kompozit kaplama	• İnatıl yapılmayacaktır		
	Dekoratif Söve	• Dekoratif Söve	Söve tüm kapı: 100 DNS Expandite Polistren Köpük – Pencere /Kapı /Kul Silmesi /Köşe silmesi rde uygulanır	
		• Mantolama Levhası / Söve Yapıştırıcısı	Çimento esaslı levha yapıştırıcısı	
	Doğal Taş	• Dekoratif Doğal Taş	2-6 mm kalınlığında doğal taş. Kısmi olarak villa giriş kapısı çevresinde derssiz olarak uygulanır.	
		• Mantolama Levhası / Söve Yapıştırıcısı	Çimento esaslı levha yapıştırıcısı	
	3D Desenli Karo	• Dekoratif duvar blokları	51 Sınıf çimento esaslı elastik harç üzerine 1.8 cm kalınlığında desenli beton karo	PerlaWall
	Tavan Kartonpiyer	• Dekoratif tavan kartonpiyer	Klasik ve sade tarzda EPS/XPS köpük kartonpiyer eleman	
Veranda/Teras		• Akrilik Esaslı Dış Cephe Boyası	2 Kat, Akrilik Esaslı Silikon Boya	Jotun
		• Akrilik Esaslı Dış Cephe Prekast Astar Boyası	1 Kat, Akrilik Esaslı Silikon Boya	Jotun
Çatı Kaplama		• Renkli Metal Köremi sac ve aksesuarları		Starband/Patchband
		• Renkli Trapez sac	0.50mm kalınlığında renkli trapez sac ile çatı örtüsü yapılması	
		• Isı yalıtım levhası	50 DNS-20mm kalınlık-0.040Wm/K°	Ravaber
		• Metal Yağmur oluğu, iniş borusu ve aksesuarları	Özel şekillendirilmiş dekoratif oluk ve iniş boruları	Başarı Metal
Pencere		• PVC doğrama	70'lik Seri-Z Profil Kasa-Çift Cam ısıcam (4+12+4)-Vasistas Mekanizma-Çift Açılım-Düz beyaz-çitasız	Winsa
İç Kapı	Standart	• Amerikan Panel Kapı		Boya:Genç / Dewilüks Aksesuar: Çebi Kilit: Kale
		• Ahşap CNC Lake Kapı	Kapı Kasa Kalınlığı 40 mm (8 mm + 8mm + 12mm + 12mm olarak) Zımparalı Ham Mdf' nin lamine edilmesiyle üretilecektir. 2 kat ipek mat lake boya	Boya:Genç / Dewilüks Aksesuar: Çebi Kilit: Kale Mdf: Kastamonu entegre
	Islak Mekân	• Amerikan Panel Kapı		Boya:Genç / Dewilüks Aksesuar: Çebi Kilit: Kale
		• Ahşap CNC Lake Kapı	Kapı Kasa Kalınlığı 40 mm (8 mm + 8mm + 12mm + 12mm olarak) Zımparalı Ham Mdf' nin lamine edilmesiyle üretilecektir. 2 kat ipek mat lake boya	Boya:Genç / Dewilüks Aksesuar: Çebi Kilit: Kale Mdf: Kastamonu entegre
Dış Kapı		• Çelik kapı		
		• Mermer Eşik		
Zemin	İç Mekân Seramik	• Seramik	Seramik:En az 60x60 boyutlarında 1. Kalite ürünlerden zemin kaplanması	Bien Seramik

	İç Mekân Parke	• Laminant Parke	AC3-31.sınıf 8mm laminant parke	Çamsan klasik
	Islak Mekân	• Seramik Kaplama	En az 45x45 boyutlarında 1. Kalite ürünlerden zemin kaplanması	Bien Seramik
		• Likit su yalıtım malzemesi	Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, yüksek elastik su yalıtım malzemesi- WEBER.dry906/ FIXA Aquacement.207	WEBER/FIXA
	• Zemin kat ıslak hacimlerde duvar ile zemin birleşim bölgesinde elastik pah bandı ve çimento esaslı elastik yalıtım harcı ile su izolasyon yapılır.			
	Balkon	• Seramik Kaplama	En az 45x45 boyutlarında 1. Kalite ürünlerden zemin kaplanması	Bien Seramik
		• Likit su yalıtım malzemesi	Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, yüksek elastik su yalıtım malzemesi- WEBER.dry906/ FIXA Aquacement.207	WEBER/FIXA
		• Korkuluk	Demir doğrama korkuluk, ahşap küpeşte	
	Trafikvar	• Bazalt karo ve bordür	Bina çevresinden 45 cm genişliğinde yapılacaktır.	
	Merdiven	• Merdiven korkuluğu	Demir doğrama korkuluk, ahşap küpeşte	
		• Mermer Kaplama	3 cm basamak 2cm riht döşenmesi	Emprador
		• Masif Ahşap		
		• Çelik profil	H, I ve U profiller	
Ahşap Doğrama	Mutfak	• Ahşap High Gloss Mutfak dolabı		Aksesuar: Samed
		• Ahşap CNC Lake Alt / Üst Mutfak dolabı		Aksesuar: Samed
		• Tezgâh Üstü Seramik Duvar Kaplama	Üst dolap ve tezgâh graniti arası 1.sınıf seramik kaplama	Ege Seramik
		• Granit Tezgâh	Yerli granit kaplama	StarGalaxy
		• Paslanmaz Çelik Evye-Batarya		Evye: Dominox Batarya: ECA Vitrifiye: Serel hygiene
	Banyo	• Ahşap High Gloss Alt banyo dolabı		Aksesuar: Samed
		• Ahşap CNC Lake Alt banyo dolabı		Aksesuar: Samed
		• Lavabo/Ayaklı Lavabo- Klozet Takımı- Lavabo Bataryası -Duş Bataryası		Batarya: ECA Vitrifiye: Serel hygiene
	WC	• Ahşap High Gloss Alt banyo dolabı		Aksesuar: Samed
		• Ahşap CNC Lake Alt banyo dolabı		Aksesuar: Samed
		• WC Taşı-Lavabo Bataryası-WC Bataryası		Batarya: ECA Vitrifiye: Serel hygiene
	• Ayaklı lavabo kullanılan bölümlerde dolap yapılmayacaktır.			
Elektrik Tesisatı	• Elektrik Tesisatı Kablolama- Anahtar-Soket-Priz- Aplik-Sigorta-TV Tesisatı			MAK-EL
Mekanik Tesisatı	• Sıhhi/Atıksu Tesisatı –Batarya -Makine Musluğu - Vana-Süzgeç			Boru, Fittings: Pilsa
Isı Tesisatı	• Isıtma tesisatlarının genetik bölümleri için		Bina verileri ısıtma ekipmanı için	

- Tabloda **silik** renkli olarak yazılan imalatlar proje kapsamında yapılmayacaktır.

İşin Tanımı

- Bu iş kapsamında, teklifte belirtilen mimari proje ve teknik özelliklere göre iki katlı bina hafif çelik yapı tekniği ile yapılacaktır.
- İş kapsamında **sözleşmeye dâhil** inşaat işleri aşağıda belirtilmiştir:
 - Statik projesine uygun özellikte çelik malzemenin temini; pres/büküm/torna işleri ile soğuk şekillendirilmiş çelik profillerin ve bağlantı elemanlarının hazırlanması,
 - İmalat çizimlerinin oluşturularak vidalı sistem ile çelik duvar, döşeme, merdiven ve çatı/teras karkaslarının imalatı ve sahada montajı,
 - İç, dış cephe, tavan ve çatı/teraslarda alçı esaslı levhalarla kaplama yapılması,
 - Çatı /Duvar , Arakat döşeme ve merdiven de OSB levhalarla kaplama yapılması,
 - Duvar aralarında, arakat döşemesi ve çatı/teras altı tavanı üzerinde yalıtım malzemeleri ile ısı/ses/yangın izolasyonu yapılması,
 - Temel-duvar birleşim yerleri ve zemin kat ıslak hacimlerin zemin-duvar birleşim yerlerinde elastik derz bantları ve çimento esaslı likit izolasyon malzemesi ile su yalıtımı yapılması,
 - Metal çatı panel ve aksesuarları ile çatı kaplama örtüsü ve yağmur tahliye sisteminin yapılması,
 - Teras/Döşeme üzerine çimento şap yapılması,
 - Yer döşemelerinde seramik/parke kaplama/bazalt ve süpürgeliklerinin yapılması,
 - Islak hacim duvarlarında fayans kaplama yapılması,
 - Banyoda ahşap dolap yapılması,
 - WC de ahşap dolap yapılması,
 - Ahşap kapıların takılması,
 - Tavanda antre, oturma odası, salon, merdiven holü ve mutfakta kısmi alçıpan asma tavan yapılması,
 - Tavanlarda kartonpiyer yapılması,
 - Pencere/kapı panjur ve sineklik yapılması,
 - Mutfak tezgâhı, dolabı ve dolap arası duvar seramiği yapılması,
 - Bina alüminyum/çelik dış kapısının takılması,
 - PVC pencere ve camların takılması,

- Pencere ve kapılarda denizlik/eşiklik mermeri konması,
- Merdiven zemini mermer/laminant parke/ahşap kaplaması,
- Balkon/Fransız Balkon korkuluk takılması,
- Banyo da duşakabin ve aksesuarlarının takılması,
- Elektrik, TV/Telekom tesisatlarının, siva üstü terminal, parça ve aksesuarlarının takılması,
- Elektrik, TV/Telekom tesisatlarının kablolama işlerinin yapılması,
- Su/atıksu tesisatlarının borulama işlerinin yapılması,
- Siva üstü vitriye, parça ve aksesuarlarının takılması,
- Isıtma/soğutma tesisatlarının grosnik borulama işlerinin yapılması,
- İş kapsamında sözleşmeye **dâhil olmayan** inşaat işleri aşağıda belirtilmiştir:
 - Bina oturma alanı zemin hafriyat işleri yapılması,
 - Mevcut yapıların sökümü, kırımı ve şantiyeden uzaklaştırılması,
 - Bina betonarme temel, temel üstü tesviyesi inşaatı/yapımı,
 - Duvar kâğıdı yapılması,
 - Dış cephede doğal patlatma taş ile kısmi dekoratif kaplama yapılması,
 - Bina çevresi tretuvar yapılması,
 - Dış duvar, iç duvar ve tavan yüzeylerinde fileli siva ve boya uygulaması yapılması,
 - Dış cephede desenli FCB levhalarla kısmi kaplama yapılması,
 - Çatıda fiberle güçlendirilmiş alçı esaslı özel levhalarla kaplama yapılması,
 - Veranda/terasta korkuluk takılması,
 - Dış cephede -en fazla 100 m² olmak şartıyla- dekoratif malzemeler ile estetik cephe yapılması,
 - Veranda yapılması,
 - Her türlü bitkilendirme, bahçe/istinat duvarı, yürüyüş yolu, bahçe/bina aydınlatma vb. peyzaj ve çevre düzenleme işleri,
 - Hidrofor ve güneş enerji-sıcak su takılması,
 - Paratoner takılması,
 - Şömine ve şömine bacası yapılması,
 - Doğalgaz ve ısıtma/soğutma tesisatlarının grosnik borulama işleri, kalorifer peteği, ekipman, parça ve aksesuarlarının takılması,
 - Klima tesisatlarının boru ve elektrik kablolarının yerleştirilmesi, ekipman, parça ve aksesuarlarının takılması,

- Gerekli olması durumunda, yapının mühendislik hesapları ve projelerinin hazırlanmasından sonra bu şartnamede sunulan mimari projede revizyon yapılabilir.
 - Kullanılacak tüm malzemeler TSE, CE belgeli 1.sınıf kalite olacaktır.
 - İnşaat işlerinin yapılması için gerekli malzeme, işçilik, konaklama, donanım, araç, nakliye, yükleme-boşaltma işleri ile bunlardan doğacak inşaat masrafları edilen anahtar teslim fiyata **dâhildir.**
 - İş bitiminde firmamız, inşaat atığı maddeleri inşaat alanından uzaklaştırarak binayı müşterimize teslim edecektir.
 - İnşaatin yapımı için şantiye alanında gerekli elektrik ve su, işveren tarafından temin edilecektir.
 - Elektrik, temiz su, atık su, yağmurlama, doğalgaz bağlantıları için gerekli borulama, rögar, menfez vs. altyapı inşaatları, şebeke bağlantıları ile resmi/özel tüm kuruluşlardan alınacak izinler, başvurular, takılması gerekli sayaç ve ekipmanlar ile bunlardan doğacak tüm masraflar müşterimize aittir.
 - Yapı için iş başlangıcında "İnşaat Ruhsatı", "Müteahhitlik Belgesi", "Sosyal Güvenlik Kurumu İş/Çalışma Dosyası" ve iş bitiminde "Yapı Kullanma İzni" belgelerinin alınması Müşterinin sorumluluğundadır. Bu iş için teklif edilen bedele; resmî kurumlara başvuruda talep edilen "İnşaat Ruhsatı, Müteahhitlik Belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İş/Çalışma Dosyası ve Yapı Kullanma İzni" alınması; laboratuvar test, deney, rapor vb. hazırlanması; yapı denetimi, danışmanlık hizmetleri alınması gibi işler ve bunlardan kaynaklanacak masraflar **dâhil değildir.**
 - Bu iş kapsamında yapılacak tüm işler şartname de açık ve net olarak belirtilmiştir. Bu metinde yer almayan, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek ilave ya da elzem işlerin yapılması ve bunlardan doğacak masraflar, sözleşme bedeline **dâhil değildir.**



